Behavioral Impact Cockpit

Phase 2: Skalierung & Optimierung

Projektplan

Version 1.0

Bezug zu Phase 1

Vorgängerprojekt: BFE-2026-001-COCKPIT
Dokumentation: projektplan_vollstaendig.yaml
Laufzeit Phase 1: 19.12.2025 – 01.03.2026
Status: Abgeschlossen

Projekt-ID:	BFE-2026-002-COCKPIT-P2
Auftraggeber:	Bundesamt für Energie (BFE)
Programm:	Energie Schweiz für Private (ECHfP)
Laufzeit Phase 2:	01.03.2026 – 30.09.2026 (7 Monate)
Budget:	CHF 145'000
Erstellt:	02.02.2026

FehrAdvice & Partners AG

Inhaltsverzeichnis

1 Bezug zum bisherigen Projektplan (Phase 1) 2
1.1 Abgeschlossene Meilensteine Phase 1 . . . 2
1.2 Ergebnisse Phase 1 . . . 2
1.3 Baseline-Werte und Ziele Phase 2 . . . 2

2 Phase 2 – Übersicht 3
2.1 Zielsetzung . . . 3
2.2 Teilziele . . . 3
2.3 Erfolgskriterien (SMART) . . . 3
2.3.1 Primäre Erfolgskriterien . . . 3
2.3.2 Sekundäre Erfolgskriterien . . . 3

3 Budget & Ressourcen 4
3.1 Budgetübersicht . . . 4
3.2 Budgetaufschlüsselung . . . 4

4 Arbeitspakete Phase 2 5
4.1 Übersicht . . . 5
4.2 AP 12 – Baseline-Review & Zieldefinition . . . 5
4.3 AP 13 – Tracking-Welle 2 . . . 5
4.4 AP 14 – Kampagnen-Modul 2: Heizungsersatz . . . 6
4.5 AP 15 – Kampagnen-Modul 3: Solarenergie . . . 6
4.6 AP 16 – Automatisierung & API-Integration . . . 6
4.7 AP 17 – Tracking-Welle 3 . . . 6
4.8 AP 18 – Interventions-Integration . . . 7
4.9 AP 19 – Tracking-Welle 4 (Abschluss) . . . 7
4.10 AP 20 – Abschluss & Übergabe . . . 7

5 Meilensteine Phase 2 8

6 Risikomanagement 9

7 Governance & Kommunikation 10
7.1 Gremienstruktur . . . 10
7.2 Eskalationsstufen . . . 10
7.3 Regelkommunikation . . . 10

8 Qualitätssicherung 11
8.1 Review Gates . . . 11

9 EBF-Integration (erweitert) 12
9.1 Referenz Phase 1 . . . 12
9.2 Erweiterungen Phase 2 . . . 12
9.2.1 Interventions-10C-Mapping . . . 12
9.2.2 Kampagnen-BCJ-Profile . . . 12
9.2.3 Longitudinale Parameter-Schätzung . . . 12

10 Ausblick Phase 3 **13**
10.1 Voraussetzungen 13
10.2 Indikative Timeline 13

1 Bezug zum bisherigen Projektplan (Phase 1)

Phase 1 – Zusammenfassung

Phase 2 baut direkt auf den Ergebnissen von Phase 1 auf. Alle Referenzen beziehen sich auf das Dokument `projektplan_vollstaendig.yaml`.

1.1 Abgeschlossene Meilensteine Phase 1

ID	Meilenstein	Datum
MS1	KPI-Architektur finalisiert	19.12.2025
MS2	Fragebogen abgenommen	15.01.2026
MS3	Dashboard-Prototyp fertig	31.01.2026
MS4	Erstmessung durchgeführt	07.02.2026
MS5	Erste Auswertung geliefert	15.02.2026
MS6	Cockpit übergeben	01.03.2026

1.2 Ergebnisse Phase 1

Die folgenden Ergebnisse bilden die Grundlage für Phase 2:

- Validiertes KPI-Framework (A-W-I-T + Gesamt-Score)
- Getesteter Fragebogen (n = 1'500 Befragte)
- Funktionales Dashboard mit Echtzeit-Daten
- Baseline-Messung aller KPIs
- Dokumentierte Berechnungslogik
- Geschultes BFE-Team

1.3 Baseline-Werte und Ziele Phase 2

KPI	Baseline (Phase 1)	Ziel Phase 2
Awareness (A)	[Nach Erstmessung]	+10 Prozentpunkte
Willingness (W)	[Nach Erstmessung]	+15 Prozentpunkte
Impact (I)	[Nach Erstmessung]	+8 Prozentpunkte
Trust (T)	[Nach Erstmessung]	+5 Prozentpunkte
Gesamt-Score	[Nach Erstmessung]	**+10 Prozentpunkte**

2 Phase 2 – Übersicht

2.1 Zielsetzung

Hauptziel Phase 2

Transformation des Behavioral Impact Cockpits von einem Pilot-Dashboard zu einem **skalierbaren, automatisierten Wirkungsmessungssystem** für alle BFE-Kampagnen im Bereich Energie Schweiz.

2.2 Teilziele

ID	Ziel	Beschreibung	Messbar
Z1	Longitudinale Analyse	3 Tracking-Wellen zur KPI-Entwicklung	3 Zyklen mit n≥1'500
Z2	Kampagnen-Erweiterung	Integration von 2 weiteren BFE-Kampagnen	2 neue Module live
Z3	Automatisierung	Automatische Datenerfassung & Reports	Manuelle Aufwände – 70%
Z4	Interventions-Integration	Verknüpfung Interventionen ↔ KPIs	3 Interventionen messbar
Z5	Wissenstransfer	Befähigung des BFE-Teams	Eigenständige Nutzung

2.3 Erfolgskriterien (SMART)

2.3.1 Primäre Erfolgskriterien

ID	Kriterium	Zielwert	Messmethode
E1	KPI-Verbesserung	Gesamt-Score +10 PP	Welle 1 vs. Welle 4
E2	Skalierung erreicht	3 Kampagnen integriert	Anzahl Module
E3	Automatisierungsgrad	≥70% automatisiert	Zeit pro Report

2.3.2 Sekundäre Erfolgskriterien

ID	Kriterium	Zielwert	Messmethode
E4	Nutzerzufriedenheit	≥4.0 / 5.0	Feedback-Befragung
E5	Budget-Einhaltung	≤105% Budget	Kostencontrolling

3 Budget & Ressourcen

3.1 Budgetübersicht

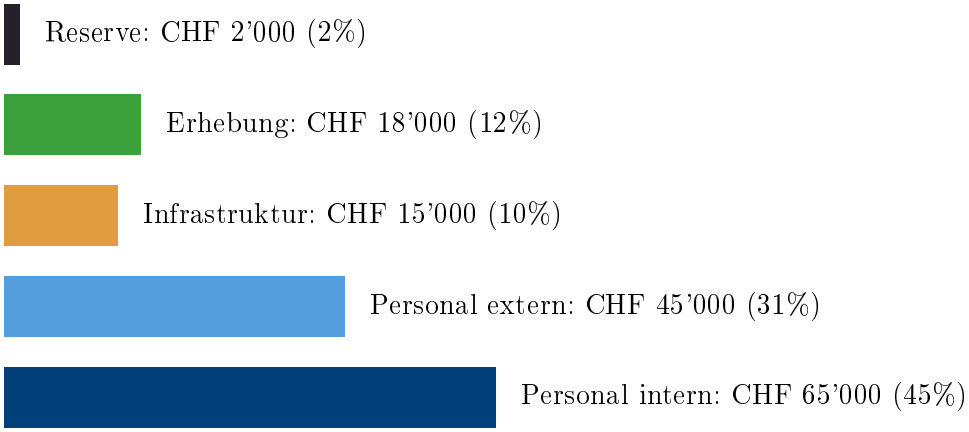

Gesamtbudget Phase 2

CHF 145'000

(Phase 1: CHF 85'000 → +71% für erweiterten Scope)

3.2 Budgetaufschlüsselung

Position	Betrag	Details
Personal intern	CHF 65'000	Projektleitung, Analysten (ca. 800h)
Personal extern	CHF 45'000	FehrAdvice Beratung, EBF-Integration
Infrastruktur	CHF 15'000	Dashboard-Hosting, API-Erweiterungen
Erhebung	CHF 18'000	3 Tracking-Wellen à 1'500 Befragte
Reserve	CHF 2'000	Unvorhergesehenes (ca. 1.4%)
Total	**CHF 145'000**	

4 Arbeitspakete Phase 2

4.1 Übersicht

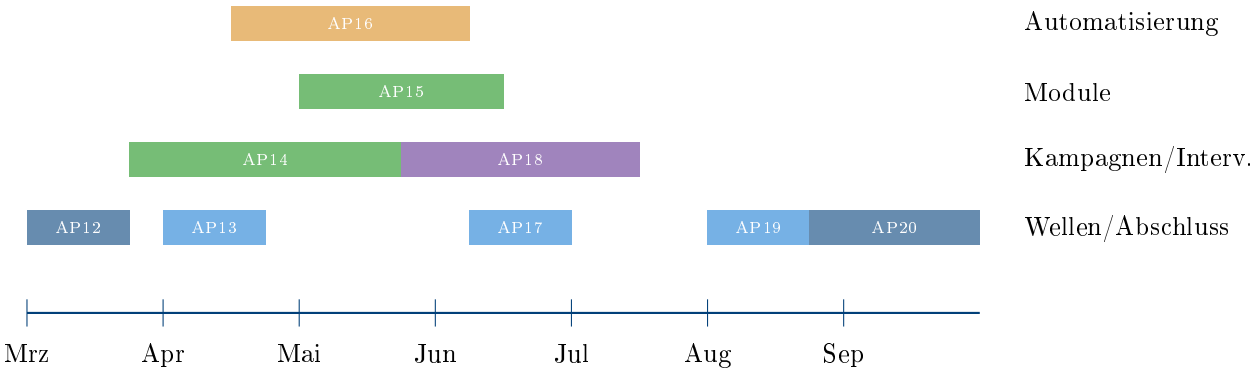

4.2 AP 12 – Baseline-Review & Zieldefinition

Verantwortlich: Lucas, Manuel
Zeitraum: 01.03.2026 – 15.03.2026
Bezug Phase 1: MS6, AP11
Aufgaben:

AP12.1 Analyse der Erstmessung aus Phase 1

AP12.2 Definition der KPI-Zielwerte für Phase 2

AP12.3 Identifikation von Verbesserungspotentialen im Cockpit

AP12.4 Priorisierung der Phase-2-Massnahmen

Ergebnis: Validierte Baseline, definierte Zielwerte, priorisierte Roadmap

4.3 AP 13 – Tracking-Welle 2

Verantwortlich: Andrea, Panel-Partner
Zeitraum: 01.04.2026 – 15.04.2026
Bezug Phase 1: AP4, AP5
Aufgaben:

AP13.1 Fragebogen-Update basierend auf Phase-1-Learnings

AP13.2 Feldphase Welle 2 (n = 1'500)

AP13.3 Datenaufbereitung und Qualitätsprüfung

AP13.4 KPI-Berechnung und Dashboard-Update

Ergebnis: Welle-2-Daten im Cockpit, erste Trendanalyse

4.4 AP 14 – Kampagnen-Modul 2: Heizungsersatz

Verantwortlich: Manuel, BFE-Fachperson
Zeitraum: 15.03.2026 – 15.05.2026
Bezug Phase 1: AP1, AP2, AP3
Aufgaben:

AP14.1 KPI-Architektur für Heizungsersatz-Kampagne

AP14.2 Fragebogen-Modul entwickeln

AP14.3 Dashboard-Erweiterung

AP14.4 Integration und Test

Ergebnis: Heizungsersatz-Modul live im Cockpit

4.5 AP 15 – Kampagnen-Modul 3: Solarenergie

Verantwortlich: Manuel, BFE-Fachperson
Zeitraum: 01.05.2026 – 30.06.2026
Bezug Phase 1: AP1, AP2, AP3
Aufgaben:

AP15.1 KPI-Architektur für Solarenergie-Kampagne

AP15.2 Fragebogen-Modul entwickeln

AP15.3 Dashboard-Erweiterung

AP15.4 Integration und Test

Ergebnis: Solarenergie-Modul live im Cockpit

4.6 AP 16 – Automatisierung & API-Integration

Verantwortlich: Tech-Lead, Manuel
Zeitraum: 15.04.2026 – 15.06.2026
Bezug Phase 1: AP3, AP9
Aufgaben:

AP16.1 Automatische Datenimport-Pipeline entwickeln

AP16.2 Scheduled Report-Generierung implementieren

AP16.3 Alert-System für KPI-Abweichungen

AP16.4 API-Dokumentation erstellen

Ergebnis: Automatisierte Pipeline, 70% weniger manuelle Arbeit

4.7 AP 17 – Tracking-Welle 3

Verantwortlich: Andrea, Panel-Partner
Zeitraum: 15.06.2026 – 30.06.2026
Bezug Phase 1: AP4, AP5
Ergebnis: Welle-3-Daten, Trendreport über 3 Wellen

4.8 AP 18 – Interventions-Integration

Verantwortlich: Lucas, FehrAdvice
Zeitraum: 15.05.2026 – 31.07.2026
Bezug Phase 1: AP6 (BCJ)
Aufgaben:

AP18.1 Interventions-Katalog mit 10C-Dimensionen erstellen

AP18.2 Verknüpfung Interventionen ↔ KPIs im Dashboard

AP18.3 A/B-Test-Tracking implementieren

AP18.4 Wirkungsnachweis für 3 Interventionen

Ergebnis: Interventions-Modul im Cockpit, messbare Wirkungsnachweise

4.9 AP 19 – Tracking-Welle 4 (Abschluss)

Verantwortlich: Andrea, Panel-Partner
Zeitraum: 15.08.2026 – 31.08.2026
Ergebnis: Finale KPI-Entwicklung, Wirkungsnachweis Phase 2

4.10 AP 20 – Abschluss & Übergabe

Verantwortlich: Lucas, Manuel, BFE-Projektleitung
Zeitraum: 01.09.2026 – 30.09.2026
Bezug Phase 1: AP10, AP11
Aufgaben:

AP20.1 Abschlussbericht Phase 2 erstellen

AP20.2 Dokumentation aller Erweiterungen

AP20.3 Schulung BFE-Team (erweiterte Funktionen)

AP20.4 Empfehlungen für Phase 3 / Regelbetrieb

AP20.5 Projekt-Abnahme durch BFE

Ergebnis: Abgenommenes, skaliertes Cockpit im Regelbetrieb

5 Meilensteine Phase 2

ID	Meilenstein	Datum	Deliverables	Abnahme
MS7	Phase-2-Kickoff	15.03.2026	• Validierte Baseline • Priorisierte Roadmap	BFE-PL
MS8	Welle 2 abgeschlossen	15.04.2026	• Welle-2-Daten • Erste Trendanalyse	BFE-PL
MS9	Kampagnen-Erweiterung	30.06.2026	• Heizungsersatz-Modul • Solarenergie-Modul	BFE-FB
MS10	Automatisierung	15.06.2026	• Auto-Pipeline • Scheduled Reports • Alert-System	Tech-Rev
MS11	Interventions-Nachweis	31.07.2026	• Welle-3-Trend • 3 Interventionen messbar	BFE-PL, FA
MS12	**Phase-2-Abschluss**	30.09.2026	• Finale Messung • Abschlussbericht • Regelbetrieb	**BFE-GL**

6 Risikomanagement

Risiko-Register Phase 2

5 identifizierte Risiken mit Massnahmen (fortlaufende Nummerierung ab Phase 1)

ID	Risiko	W	A	Massnahmen
R6	Panel-Kapazitäten bei 4 Wellen	M	M	• Frühzeitige Buchung • Backup-Panel
R7	Technische Komplexität Automatisierung	M	H	• Agile Sprints • Frühes MVP
R8	Unzureichende KPI-Verbesserung	N	H	• EBF-Interventionen • Kontinuierliches Monitoring
R9	Ressourcenengpässe BFE-Fachbereiche	M	M	• Feste Ansprechpartner • Klare Zeitfenster
R10	Budget-Überschreitung (Scope Creep)	M	M	• Strikte Scope-Definition • Change-Request-Prozess

W = Wahrscheinlichkeit (N/M/H), A = Auswirkung (N/M/H)

7 Governance & Kommunikation

7.1 Gremienstruktur

Gremium	Mitglieder	Rhythmus	Entscheidungen
Steuerungsausschuss	BFE-GL, FA-Partner, PL	Alle 2 Monate	Budget, Scope, Eskalationen
Projektteam	Lucas, Manuel, Andrea, BFE	Wöchentlich	Operative Umsetzung

7.2 Eskalationsstufen

fe 3: BFE-Geschäftsleit	Projektabbruch, Richtungsänderung
fe 2: Steuerungsaussch	Verzögerungen >2 Wochen, Budget >10%
Stufe 1: Projektleitung	Verzögerungen <2 Wochen, Budget <10%

7.3 Regelkommunikation

Typ	Rhythmus	Empfänger	Format
Statusbericht	Monatlich	Steuerungsausschuss	PPT, max. 10 Slides
Wellen-Report	Nach jeder Welle	BFE-PL, Fachbereiche	PDF aus Cockpit
Sprint-Review	Alle 2 Wochen	Projektteam	Live-Demo

8 Qualitätssicherung

8.1 Review Gates

Gate	Meilenstein	Prüfer	Kriterien
RG4	MS7 (Roadmap)	BFE-PL	• Baseline analysiert • Zielwerte plausibel • Roadmap abgestimmt
RG5	MS9 (Module)	BFE-FB, Tech	• KPI-Logik validiert • Dashboard getestet • Datenqualität OK
RG6	MS10 (Auto)	Tech, BFE-IT	• Performance OK • Fehlerbehandlung robust • Doku vollständig
RG7	MS12 (Abschluss)	**BFE-GL**	• Erfolgskriterien geprüft • Wissenstransfer OK • Regelbetrieb bereit

9 EBF-Integration (erweitert)

9.1 Referenz Phase 1

EBF-Grundlagen aus Phase 1

- **Messmodell:** A-W-I-T Framework mit EBF-Parametern
- **BCJ-Profil:** Baseline-Daten der Zielgruppe
- **Validierte Parameter:** β, λ, θ, W_{base} aus Erstmessung

9.2 Erweiterungen Phase 2

9.2.1 Interventions-10C-Mapping

Jede Intervention wird einer 10C-Dimension zugeordnet:

Intervention	10C-Dimension	Ziel
Heizungs-Rechner	AWARE	A(Heizungsersatz) $\uparrow$ 0.15
Förder-Konfigurator	WHAT (F)	u_F(Subvention) $\uparrow$
Nachbarschafts-Vergleich	WHAT (S)	u_S(Norm) $\uparrow$ 0.20

9.2.2 Kampagnen-BCJ-Profile

Jede neue Kampagne erhält ein eigenes BCJ-Profil:

Kampagne	BCJ-Fokus
Heizungsersatz	CONSIDERING $\rightarrow$ INTENDING
Solarenergie	INTENDING $\rightarrow$ ACTING

9.2.3 Longitudinale Parameter-Schätzung

Parameter-Updates basierend auf 4 Wellen:

Parameter	Welle 1	Ziel Welle 4	Intervention
β (present bias)	0.82	0.88	Commitment-Device
λ (loss aversion)	2.1	–	Loss-Frame Messaging
θ (activation)	0.45	0.35	Reminder-System

10 Ausblick Phase 3

Mögliche Ziele Phase 3 (2027)

- Vollständige Automatisierung aller BFE-Kampagnen
- Predictive Analytics (KPI-Prognosen)
- Integration mit BFE-CRM und externen Datenquellen
- Skalierung auf weitere Bundesämter

10.1 Voraussetzungen

- Erfolgreiches Phase-2-Ergebnis (≥80% Zielerreichung)
- Budget-Freigabe durch BFE
- Stabiler Regelbetrieb des Cockpits

10.2 Indikative Timeline

Phase 3: Q1/2027 – Q4/2027

Behavioral Impact Cockpit

Phase 2: Skalierung & Optimierung

Projektplan Version 1.0
Erstellt: 02.02.2026

Aufbauend auf Phase 1 (BFE-2026-001-COCKPIT)
